


道路陥没箇所の復旧工程

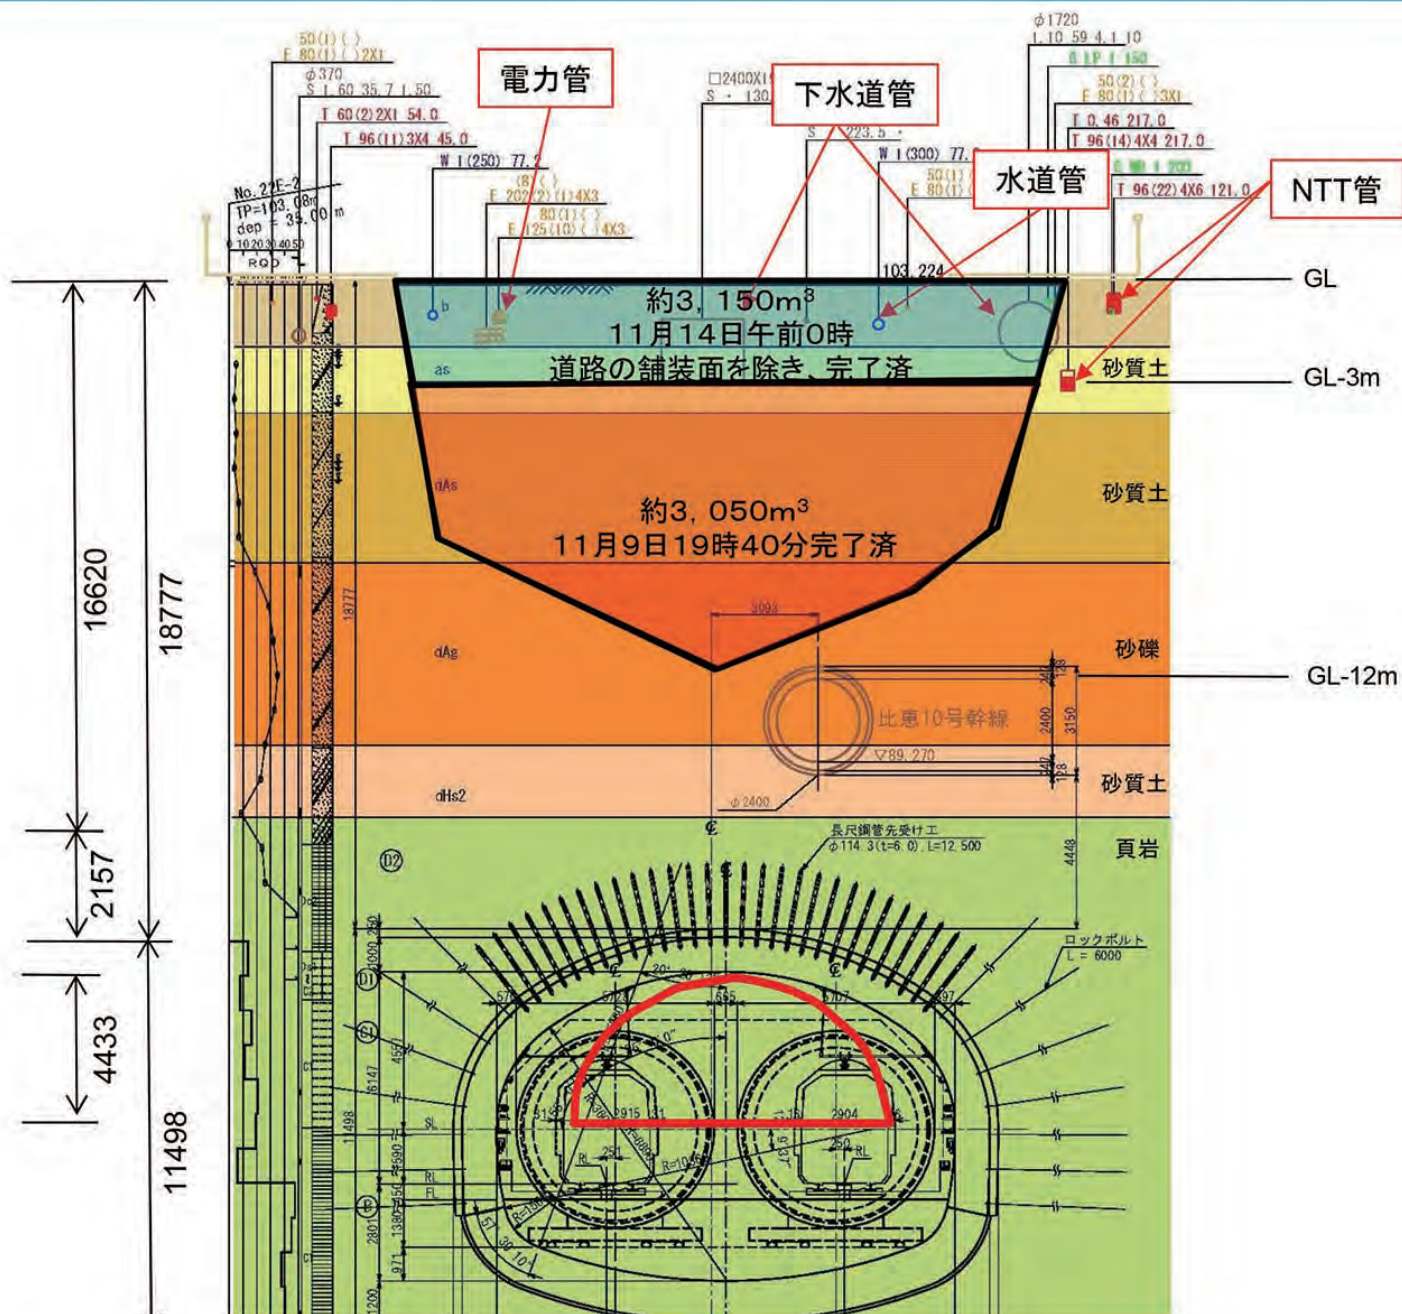

- ・11月8日(火)14:30頃 埋め戻しを開始
- ・11月9日(水)19:40頃 復旧作業に着手可能となるGL-3mまでの埋め戻し(約3,050m³)が完了
- ・11月10日(木) 埋設管下への砕石によるマウントアップ
GL-3mへのスロープの設置
- ・ライフラインの復旧状況
 - ① 下水道 : 11月13日20時20分 復旧作業完了
 - ② ガス : 11月12日14時 復旧作業完了
 - ③ 電力 : 11月12日22時 復旧作業完了
 - ④ NTT : 11月12日23時30分 復旧作業完了
 - ⑤ 上水道 : 11月11日13時 復旧作業完了
 - ⑥ 信号 : 11月14日19時30分 復旧作業完了
 - ⑦ 仮舗装 : 11月15日 2時30分 復旧作業完了
